


# Breitbandausbau Kamen, Bönen, Bergkamen

## Sachstandsbericht

Betriebsausschuss – öffentlicher Teil  
24.06.2020

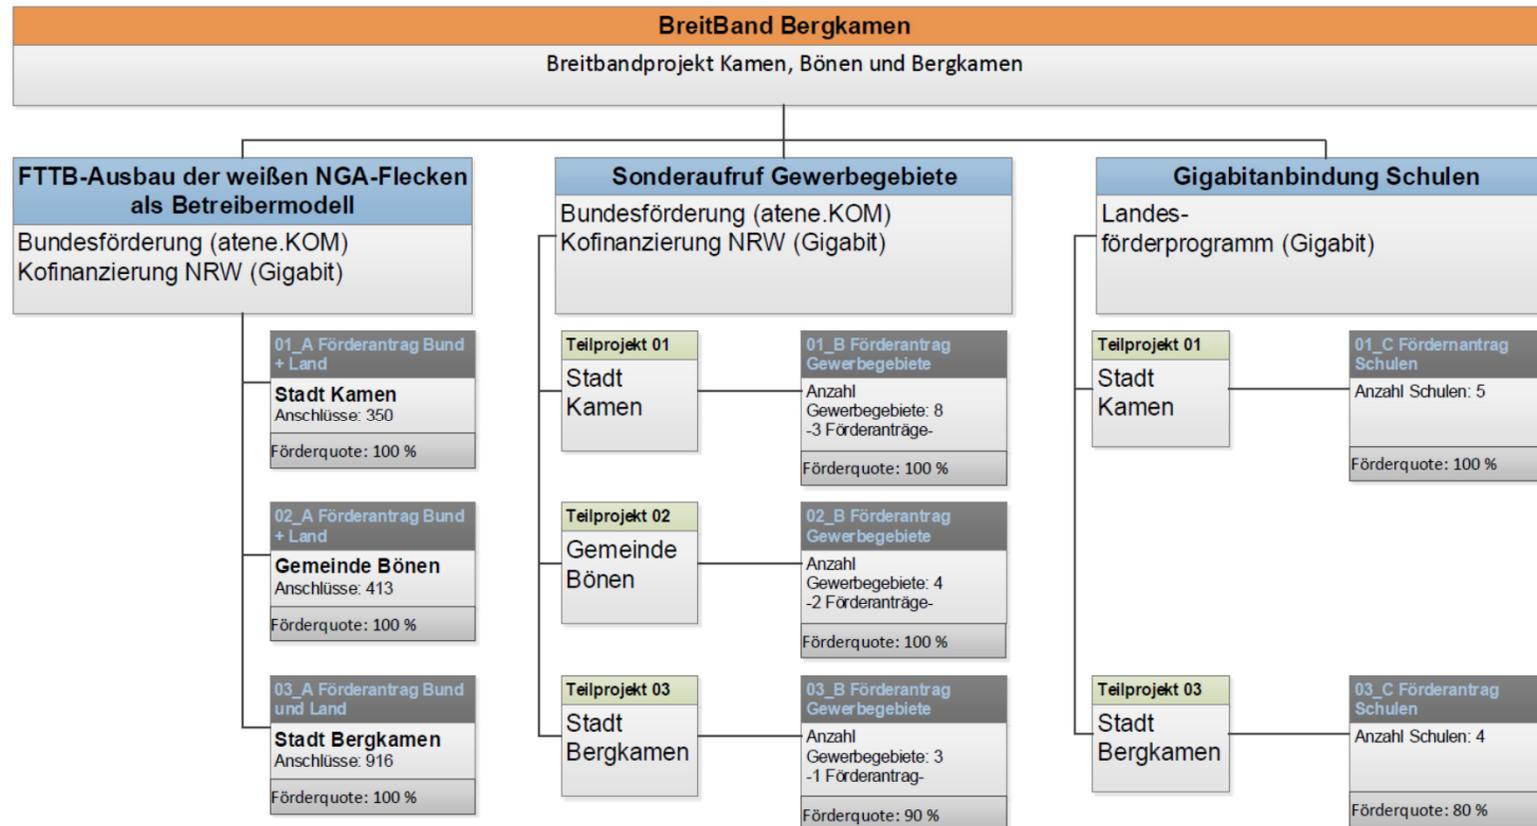

## Anbindung der Schulen (Bund/Land)

Kommunen	Bund	Land	erschlossen
Bergkamen	6	4	1
Kamen	6	5	0
Bönen	5	0	0
Kreis Unna	2	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

## Gigabit-Anbindung Schulen (Land)

- November 2019: Förderantragsstellung durch die Schulträger
- Dezember 2019: Ratssitzungen in Kamen und Bergkamen – Beschlussfassung zur Beauftragung (unter Vorbehalt)
- Dezember 2019:
  - Endgültiger Bewilligungsbescheid
  - Kamen: 655.690,00 Euro (kein Eigenanteil)
  - Bergkamen: 688.772,00 Euro (davon 20% Eigenanteil, d. h. 137.754,00 Euro)

## Gigabit-Anbindung Schulen (Land)


- Januar 2020: Beauftragung HeLiNET
- 2020: Planung und Bau
  - Ausschreibung/Vergabe Tiefbaumaßnahmen (GSW)
  - Planung/Umsetzung Tiefbaumaßnahmen
- 2021: Fertigstellung der äußeren Anbindung
- Inhouseverkabelung/Medienkonzepte (Schulträger)

## Gigabit-Anbindung Schulen (Land)



Pressetermin Gigabit-Anbindung Schulen  
mit HeLi NET, Februar 2020.  
Quelle: WFG Kreis Unna

# Sonderauftrag Gewerbegebiete

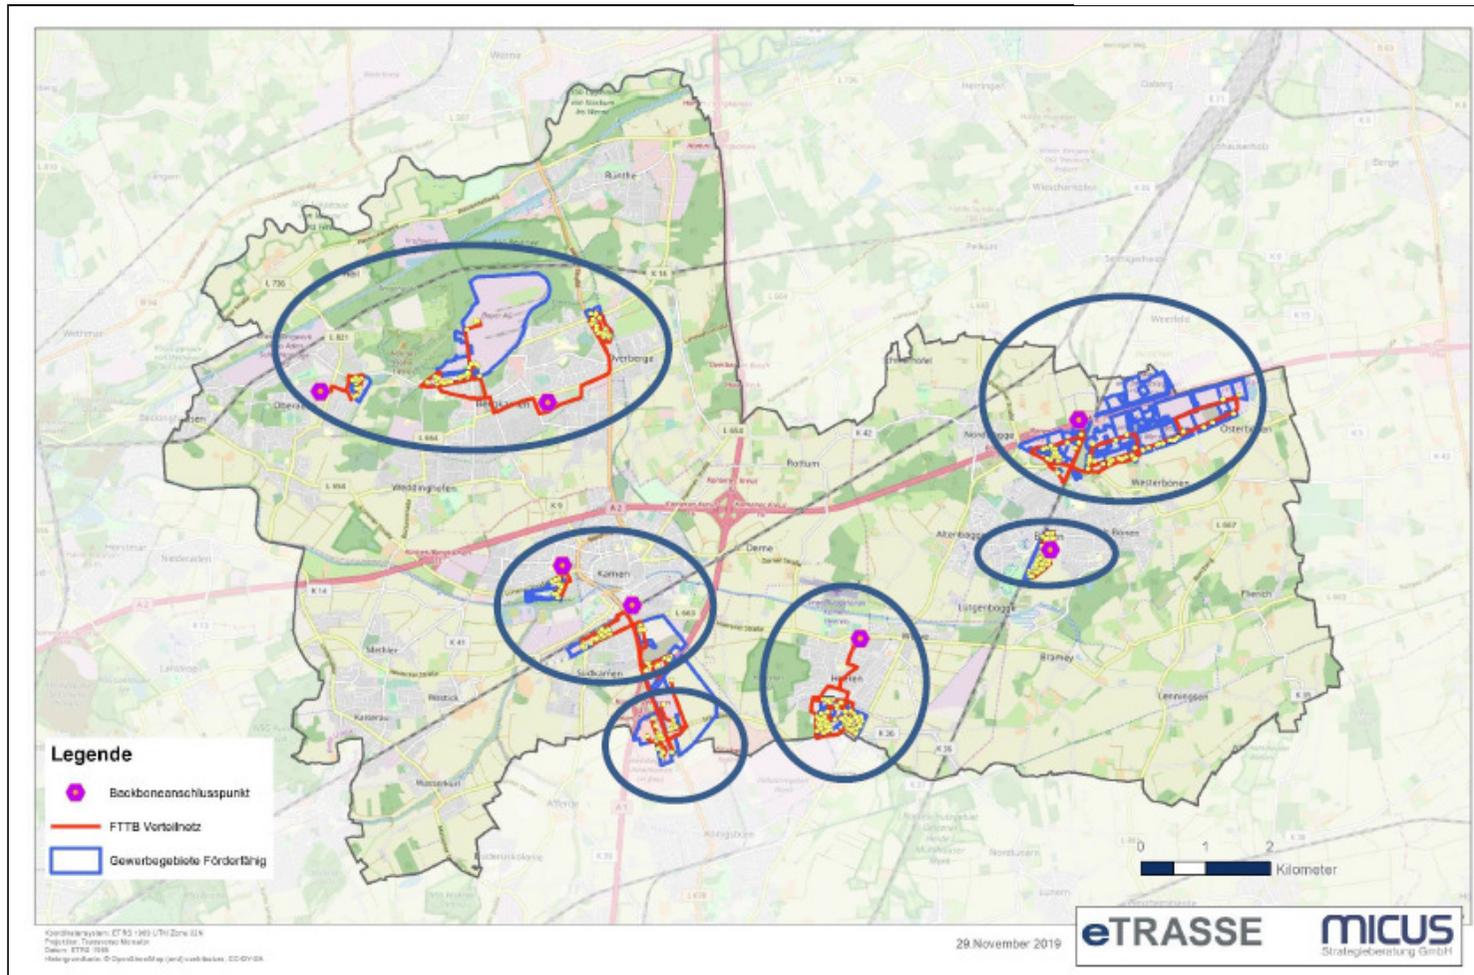

# Sonderaufruf Gewerbegebiete



Bergkamen	Am Heidegraben & Grimberg	1 1.290.199,90 €
	Am Schlagbaum	
	In der Schlenke / Im Kattros	
Kamen	Technologiepark	2 1.207.714,90 €
	Dortmunder Allee	
	Hemsack	
	Zollpost	3 1.672.929,50 €
	Edisonstraße	
	Gutenbergstraße	
	Henry-Everling-Straße	
	Kamen Karree	
	Am Mühlbach	4 1.020.006,90 €
	Südfeld	
Bönen	Rudolf-Diesel-Straße	5 1.505.844,00 €
	Am Mersch	
	InlogParc	6 374.515,20 €
	Poststraße	

## Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Beantragung Fördermittel Dezember 2019
- Vorläufige Bewilligungsbescheide Bund Februar 2020 (Kamen, Bergkamen)
- Bewilligung Bund Vorzeitiger Maßnahmenbeginn Mai 2020 (Bönen)
- Antrag Vorzeitiger Maßnahmenbeginn – Kofinanzierung Land – Mai 2020

## Sonderaufruf Gewerbegebiete

- Ausschreibung Netzplanung/-bau/-betrieb bis Ende 2020 (Eigenbetrieb und Kommunen)
- Konkretisierung Förderanträge Anfang 2021
- Endgültige Förderbescheide Mitte 2021
- Bauliche Umsetzung in 2021/22

## Weißer Flecken: Netzplanung (VgV)

Durchführung Verhandlungsverfahren (August 2019 bis Mai 2020)

- Vorbereitung Bekanntmachung/Leistungsbild
- Angebotsbekanntmachung EU-weit
- Einreichen Teilnahmeanträge
- Prüfung/Wertung/Auswahl
- Verhandlungsangebote
- Prüfung der Verhandlungsangebote
- Bietergespräche mit ausgewählten Planungsbüros
- Aufruf zur Abgabe der finalen Angebote

## Weißer Flecken: Netzplanung (VgV)

Durchführung Verhandlungsverfahren (Juni 2020)

- Vergabevorschlag (Kanzlei Muth & Partner, Projektsteuerer pm.a)
- Vergabeentscheidung
- Information nach § 134 GWB
- Zuschlag Planungsauftrag

## Weiße Flecken: Besonderheiten des Netzes

- 17 Bahnquerungen
- 11 Autobahnquerungen
- 20 Gewässerquerungen
- Biotop, Kampfmittel,...
- Unbekannte Adressen und Datenlage

## Weißer Flecken: Rahmenterminplan

Thema	Soll	Ist
Beauftragung Fachplanung	03/2020	06/2020
Fertigstellung Genehmigungsplanung	08/2020	11/2020
Fertigstellung Ausführungsplanung	01/2021	04/2021
Fertigstellung Leistungsverzeichnis	02/2022	05/2022
Baubeginn	06/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	10/2023	01/2024



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Marc Alexander Ulrich**  
**Stadt Bergkamen**  
**Betriebsleiter BreitBand Bergkamen**  
Tel. 02307 965 287  
E-Mail: [m.ulrich@bergkamen.de](mailto:m.ulrich@bergkamen.de)
